Dirección y Gestión de Proyectos

Tema 2. Principios, Áreas y Dominios de PMI

Grado Ingeniería Informática

Cuarto curso.

Especialidad Ingeniería del Software

Objetivos

- Conocer los principios que rigen el PMI para la gestión de proyectos, así como las áreas y dominios de PMBOK.
- Conocer algunos de los documentos usados o elaborados en la petición de un proyecto.
- Aprender qué tareas se realizan en el inicio de un proyecto
- Aprender conceptos y conocer actividades relacionadas con la planificación temporal, la organización de tareas y recursos, así como con el control de cambios, riesgos y calidad.
- Conocer las implicaciones del cierre de un proyecto.


Contenidos

2.1. Principios
2.2. Áreas focales
2.3. Dominios
2.4. Procesos
2.5. Tipos de tareas de gestión
2.6. Redacción del proyecto
2.7. Inicio
2.8. Planificación
2.9. Ejecución
2.10. Control
2.11. Cierre


2.1. Principios

Principio	Idea clave
Visión holística (Adopt a Holistic View)	Analiza el proyecto como un sistema completo, considerando dependencias, contexto organizacional y efectos colaterales.
Enfoque en el valor (Focus on Value)	Prioriza la generación de valor para la organización y los interesados, no solo la entrega de productos.
Calidad integrada (Embed Quality into Processes and Deliverables)	La calidad se construye durante el trabajo; no se limita a inspecciones finales.
Liderazgo responsable (Be an Accountable Leader)	Actúa con responsabilidad, ética, transparencia y rendición de cuentas.
Sostenibilidad (Integrate Sustainability)	Considera impactos económicos, sociales y ambientales en las decisiones del proyecto.
Cultura empoderada (Build an Empowered Culture)	Fomenta autonomía, colaboración, confianza y aprendizaje continuo en el equipo.

2.2. Áreas focales

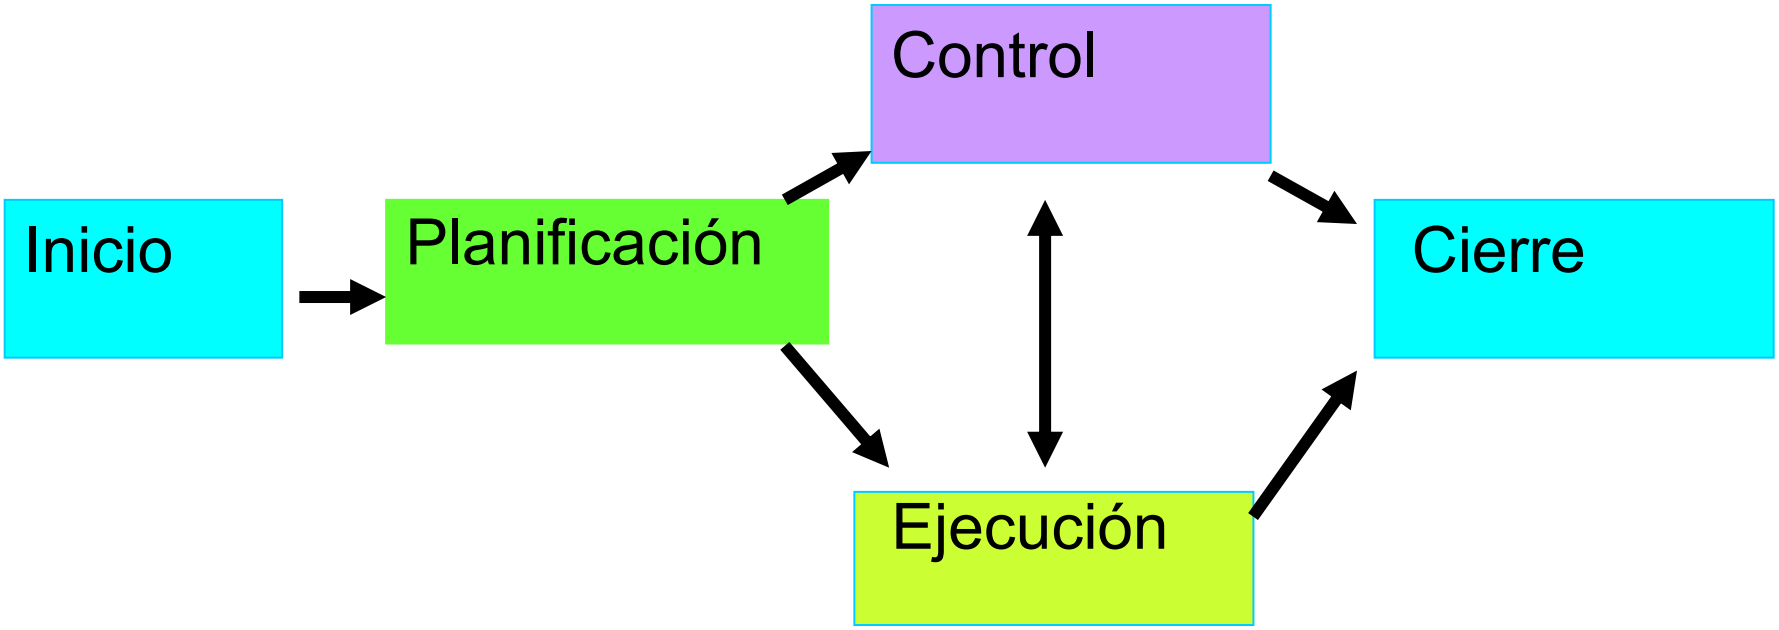


2.2. Áreas focales y metodologías ágiles

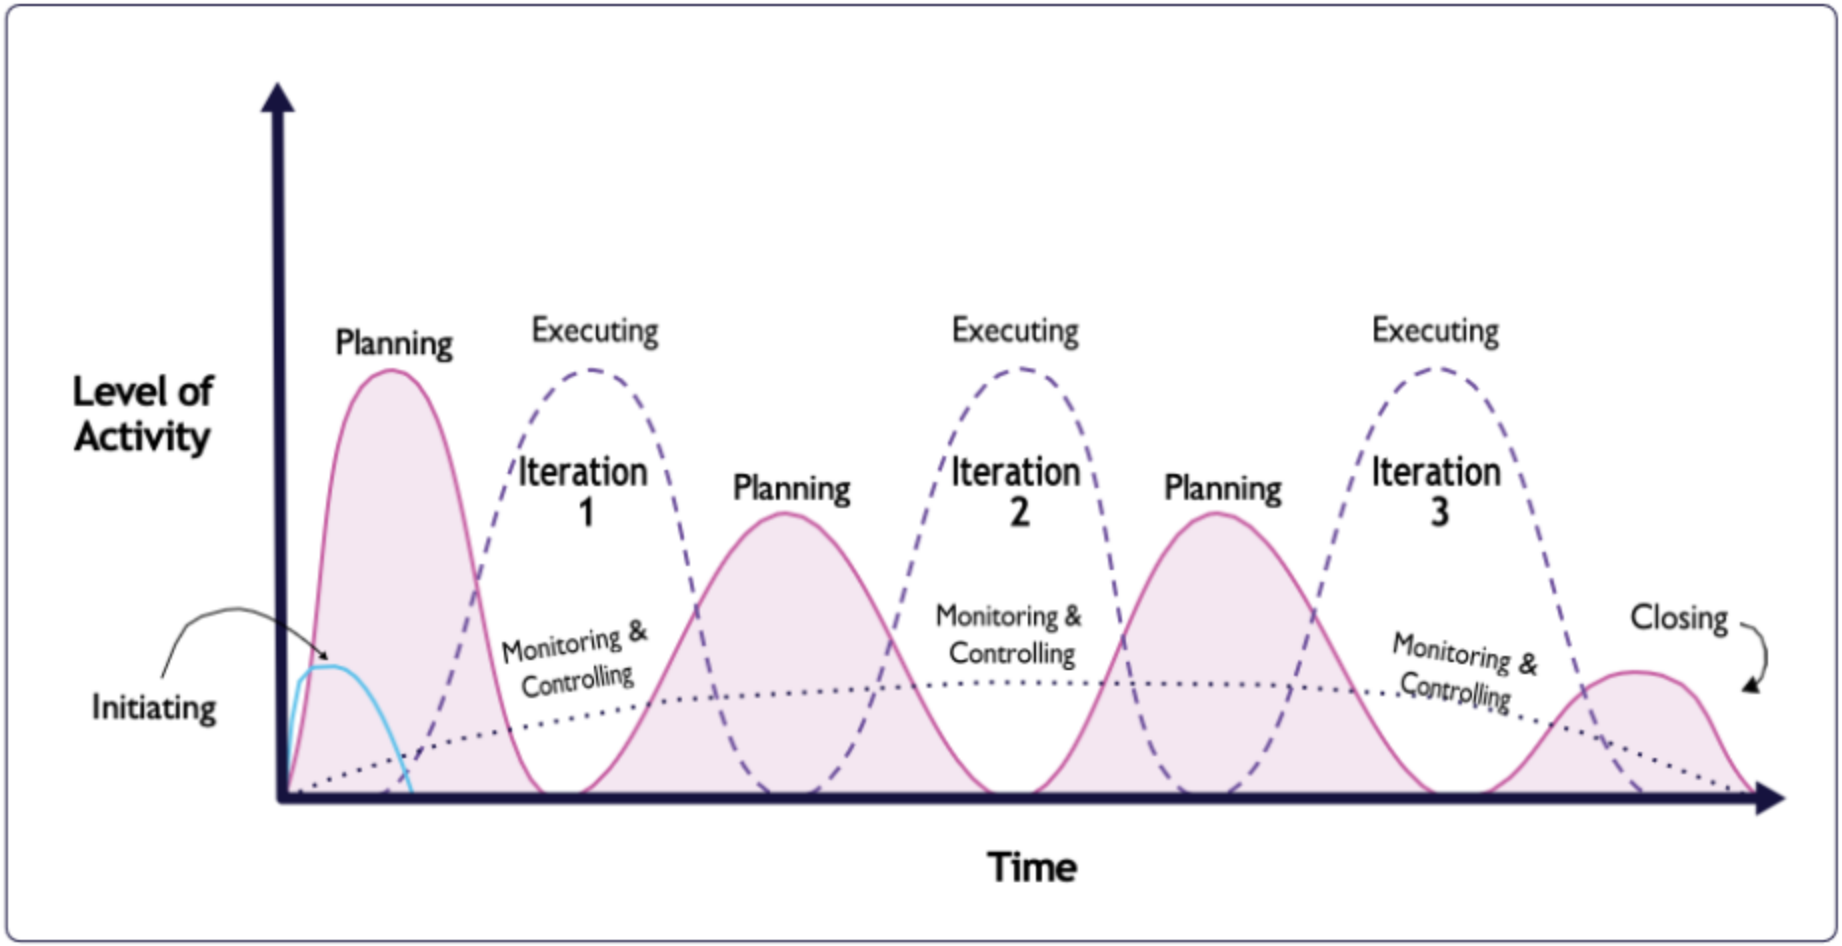

2.3. Dominios

Dominio	Propósito
Gobernanza (Governance)	Dirección, integración, control de cambios, calidad, adquisiciones, cierre, alineamiento estratégico.
Alcance (Scope)	Requisitos, definición y control del alcance.
Cronograma (Schedule)	Planificación temporal, secuenciación y seguimiento de plazos.
Finanzas (Finances)	Costes, presupuestos, financiación y seguimiento económico.
Interesados (Stakeholders)	Identificación, comunicación y gestión de expectativas.
Recursos (Resources)	Equipos, liderazgo, recursos físicos y capacidades.
Riesgos (Risks)	Incertidumbre, análisis de riesgos y respuestas.

2.3. Dominios y principios

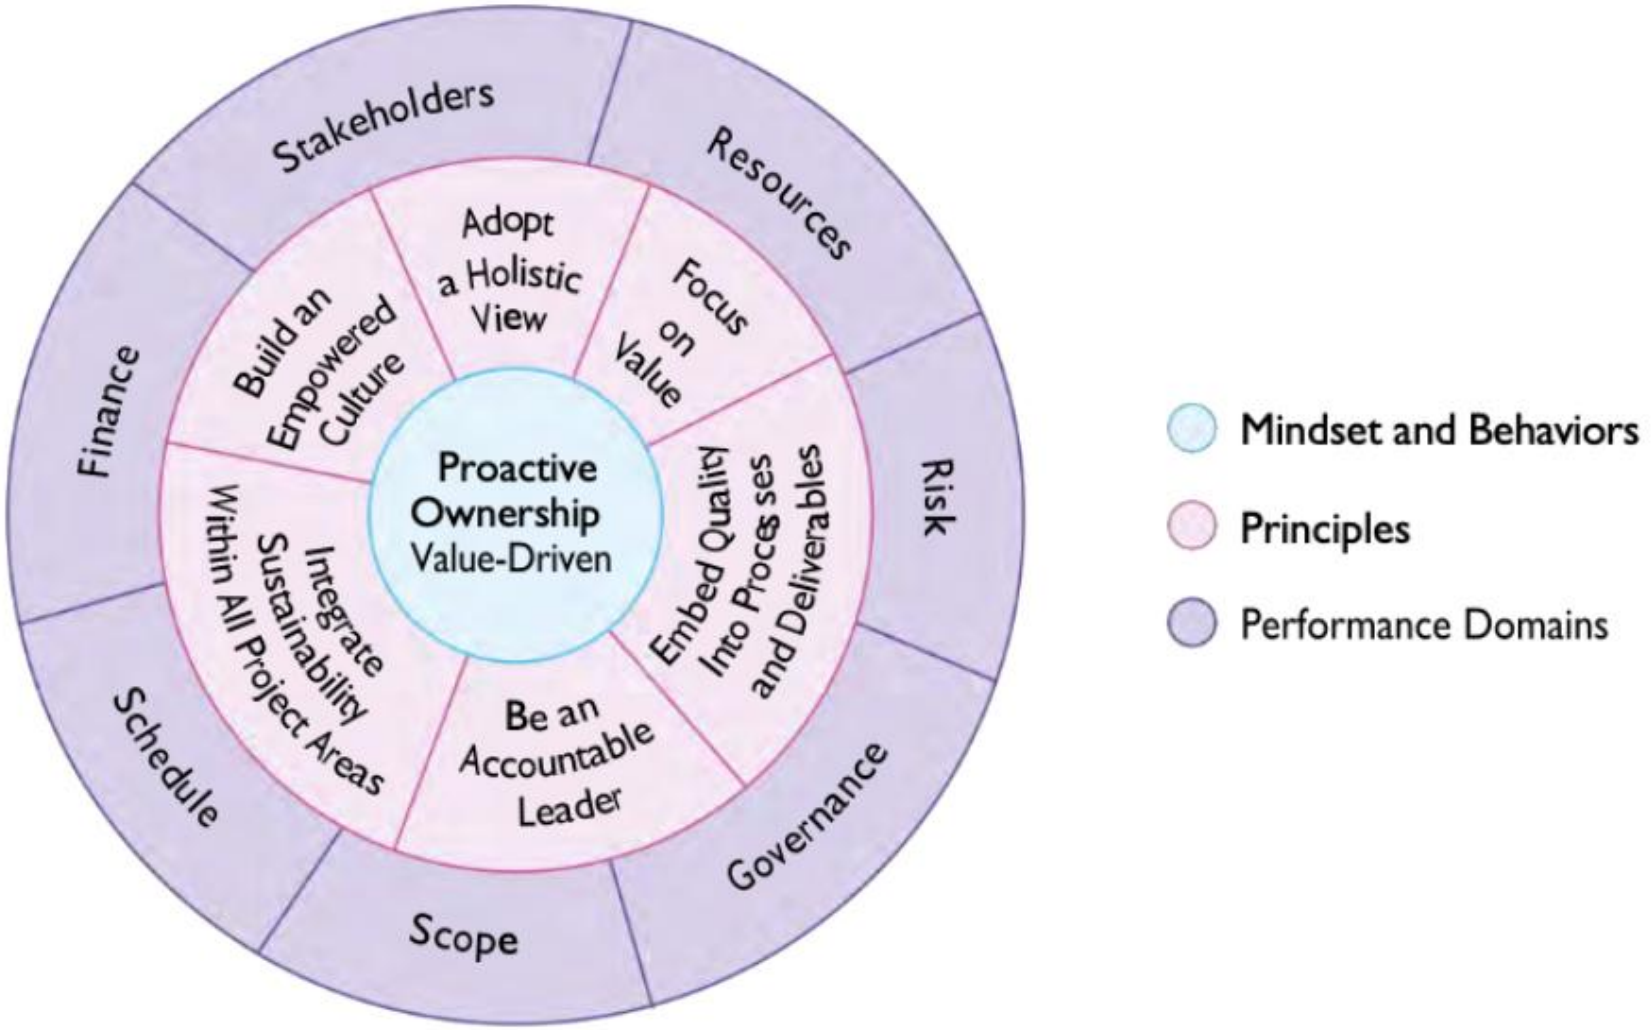

2.4. Procesos

Dentro de cada dominio hay unos procesos para organizar los flujos de trabajo, y se corresponden con diferentes áreas (inicio, planificación, control, ejecución y cierre).

Ejemplo:

Procesos incluidos en el dominio Alcance

- Planificar la Gestión del Alcance
- Captura y análisis de requisitos
- Definir el alcance
- Desarrollar la estructura del alcance (EDT o WBS)
- Validar el alcance
- Monitorizar y controlar el alcance

2.5. Tipos de tareas de gestión

Tareas de la gestión de un proyecto:

- Administrativas: organización, gestión económica (ingresos, costes)
- Gestión: toma de decisiones, control de la ejecución, recursos, comunicaciones, …

2.6. Redacción del proyecto

Previo al inicio del proyecto:

- Cliente: Pliegos de condiciones (proyectos públicos)
- Desarrolladores: Redacción para petición (*Propuesta técnica*) según pliegos de condiciones.

(ver ejemplos de licitaciones en

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones)

2.6. Redacción del proyecto

Redacción detallada de propuesta técnica

- Objetivos
- Caso de negocio
- Ámbito o alcance, requisitos
- Entregables
- Tecnología usada
- Características del proceso

2.6. Redacción del proyecto

Concretar también los aspectos administrativos del contrato:

- Costes de producción
- Riesgos de alto nivel
- Plazos de ejecución
- Fechas de entrada de ingresos
- Calidad de los productos, nivel de cumplimiento de especificaciones (principalmente RNF)
- Compromisos en mantenimiento o garantía
- Formación
- ….

2.7. Inicio

Autorización del proyecto o de una fase de éste, con el compromiso de realizarlo.

- Firma de contrato: aceptación por cliente y equipo
- Identificación de stakeholders
- Asignación de un gestor del proyecto, si no se ha hecho en la fase de redacción.
- Estructuración del proyecto en fases, paquetes o subproyectos
- Elaborar el Acta de Constitución y el Plan de Dirección “project charter” o manual de coordinación (ver Manual_Coordinación.pdf)

2.8. Planificación

Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar sus objetivos y definir el curso de las acciones a realizar para lograr los objetivos.

- Requisitos, alcance (“scope”) y estructura
- Documentos de planificación del proyecto (tareas-tiempo-recursos)
- Otros documentos de planificación: costes, calidad, comunicación, riesgos, adquisiciones, recursos humanos, implicados

2.9. Ejecución


Procesos requeridos para completar el plan de gestión del proyecto para satisfacer las especificaciones del proyecto.

- Realizar tareas del proyecto según la planificación: tiempo, calidad, costes, calidad
- Coordinación de personas (comunicación)
- Gestión de recursos (principalmente humanos)

2.10. Control del proyecto

- Procesos requeridos para monitorizar, revisar y regular el desarrollo del proyecto.
  - **-Control de calendario, costes y recursos**
  - **-Control de calidad, riesgos y comunicaciones**
  - **-Control del ámbito o alcance (requisitos)**
- Identifica cuándo hay que realizar cambios sobre la planificación e inicia los cambios correspondientes: "prevenir o reparar".
- Los cambios son inevitables, deben ser mínimos y consensuados.

2.10. Control del proyecto

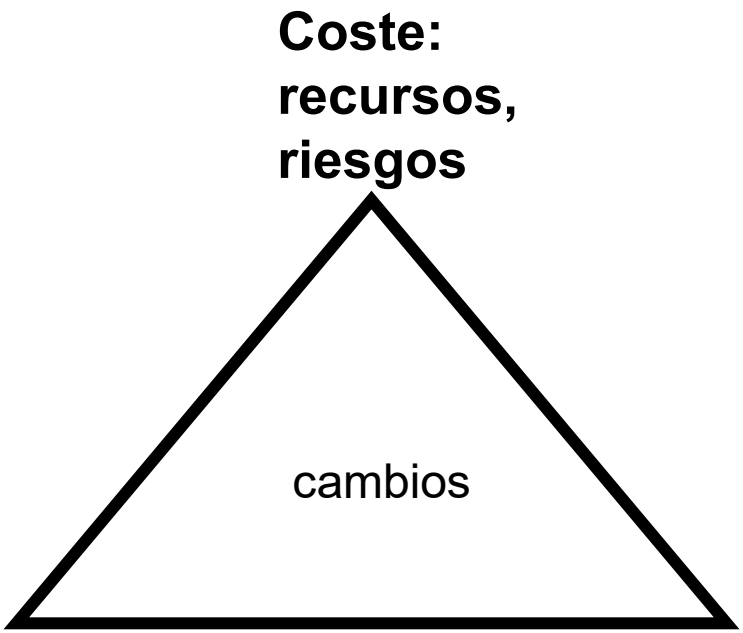

La gestión depende del tamaño y tipo de proyecto

2.11. Cierre del proyecto

Procesos realizados para finalizar todas las actividades y cerrar formalmente un proyecto o una fase de éste.

Motivos del cierre: se alcanzan objetivos, no se logran algunos objetivos, no se necesita continuar.

- Formalización de finalización y entrega-instalación
- Aceptación del cliente o promotor
- Fase de revisión o post-proyecto (piloto)
- Documento de lecciones aprendidas
- Archivo de documentación: datos históricos
- Transferencia a otros proyectos
- *Celebración* si es el caso
